ガチン固透水型自然土舗装　現場透水試験結果表

工　事　名	品質管理	測定年月日	令和1年　11月　20日
工事場所	北九州市若松区大字竹並	気　温	21℃　路面温度　21℃
測　点	自社試験		
試験方法	現場透水試験	透水量	952ml/15sec
試　験　機	ﾌﾘｰｼﾞｱﾏｸﾛｽ㈱　TR-328 現場透水試験機	試　験　者	大山　博志　印

測点番号	測　点	400cc流下時間		備　考
1	自社試験 t=50mm	t1	6.4 sec	
		t2	6.4 sec	
		t3	6.3 sec	
		t4	6.3 sec	
		平均(t)	6.3 sec	952 ml/15sec

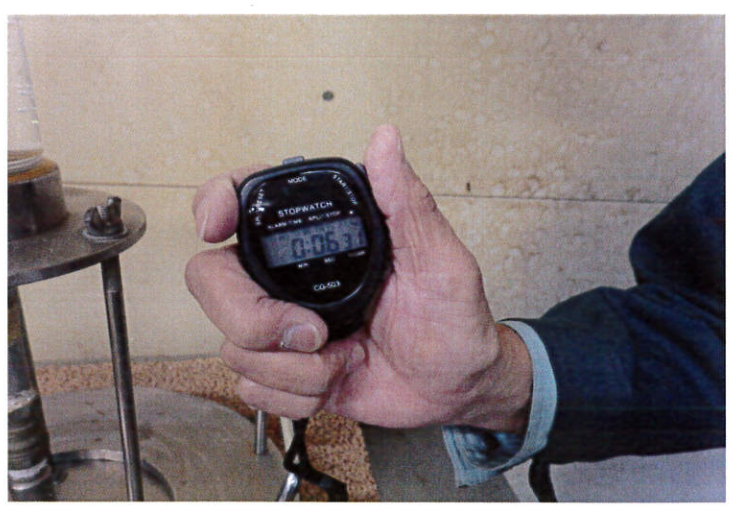

備　考

基準値 300ml以上/15sec　　t(sec)=(t2+t3+t4)/3

透水量(ml/15sec)=(400/t)×15
